



完了報告書

〇〇 〇〇 様邸塗装工事



2022年12月24日

リーフ株式会社


埼玉県坂戸市島田 91-3



2022年12月1日
内容：足場設置



2022年12月3日
箇所：屋根
内容：高圧洗浄

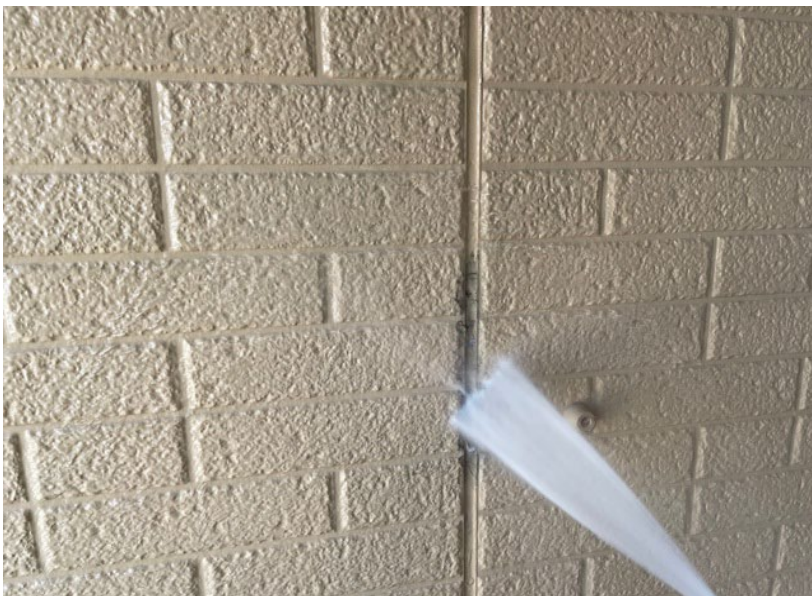

2022年12月3日
箇所：外壁
内容：高圧洗浄



2022年12月4日
箇所：コーキング
内容：撤去




2022年12月5日
箇所：コーキング
内容：プライマー
材料：US-3



2022年12月6日
箇所：コーキング
内容：打ち込み
材料：ペンギンシール2550LM



2022年12月8日
箇所：屋根
内容：タスペーサー取付
材料：タスペーサー02

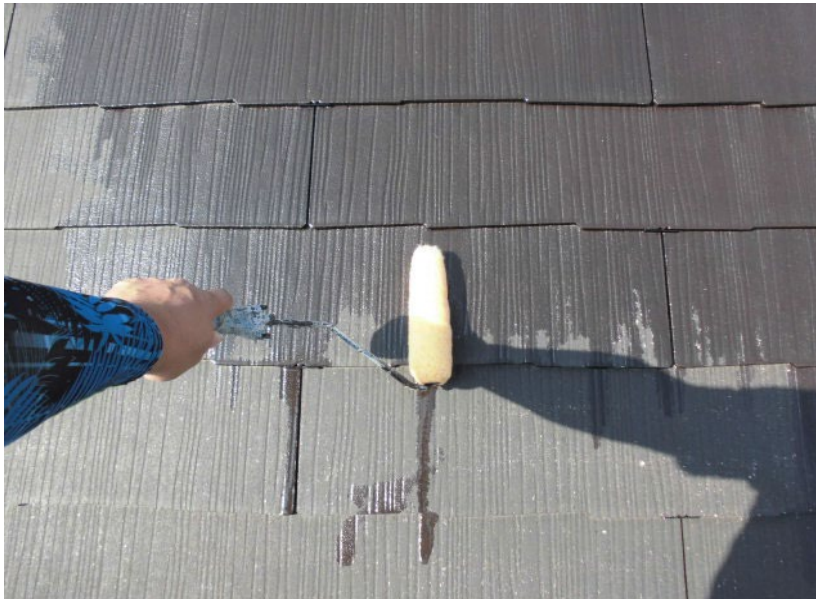

2022年12月8日
箇所：屋根
内容：下塗り
材料：ファイン浸透シーラー



2022年12月9日
箇所：屋根
内容：中塗り
材料：ファインパーフェクトベスト ブラック




2022年12月10日
箇所：屋根
内容：上塗り
材料：ファインパーフェクトベスト ブラック



2022年12月12日
箇所：外壁
内容：下塗り
材料：パーフェクトサーフ



2022年12月13日
箇所：外壁
内容：中塗り
材料：パーフェクトトップ ND-010

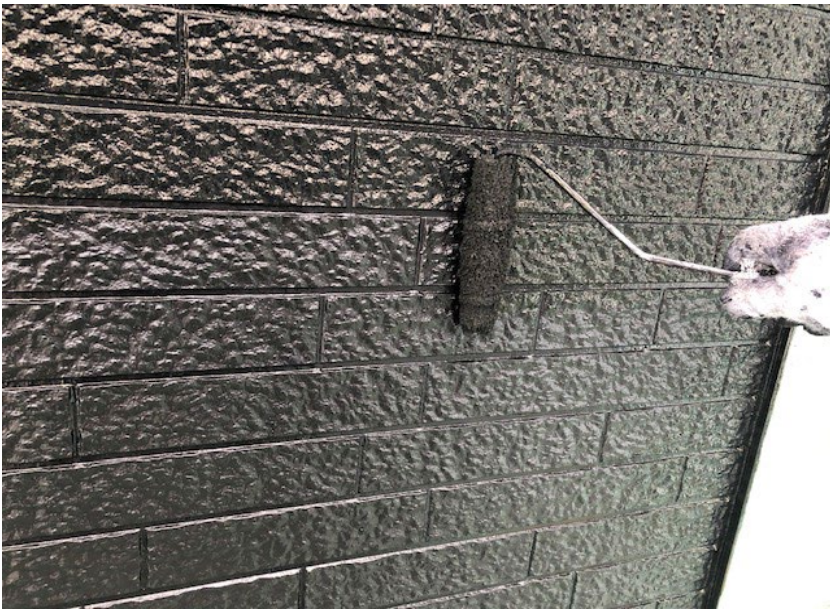

2022年12月14日
箇所：外壁
内容：上塗り
材料：パーフェクトトップ
ND-010



2022年12月15日
箇所：破風、雨樋
内容：上塗り
材料：ファインウレタンU100
N-85



2022年12月18日
箇所：バルコニー床
内容：下塗り
材料：FRP防水専用プライマー



2022年12月18日
箇所：バルコニー床
内容：中塗り
材料：弾性トップ14
フォックスグレー



2022年12月19日
箇所：バルコニー床
内容：上塗り
材料：弾性トップ14
フォックスグレー



2022年12月20日
箇所：水切
内容：上塗り
材料：ファインウレタンU100
N-15



箇所：屋根
内容：施工後
材料：ファインパーフェクトベスト ブラック



箇所：破風、軒樋
内容：施工後
材料：ファインウレタンU100 255



箇所：バルコニー床
内容：施工後
材料：弾性トップ14 フォックスグレー
